
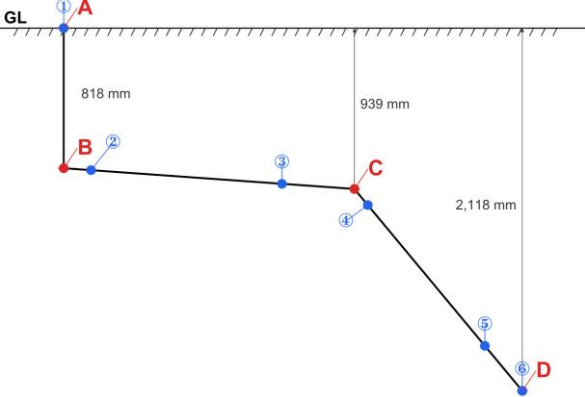



現場名		整理番号		取付管番号	
現場住所		点検日		点検担当者	
平面		正面		立面	
					


マッピング解析結果

区間	配管長 (mm)	角度 (合成角)	角度(°)	改築部材 No.
A→B	818	-	-	1
B→C	1,699	∠C	85.9	3
C→D	1,533	∠D	46.2	5

調査結果（特記事項）

No.	特記事項
①	J1 GL
②	J2 接続部
③	J3 接続部
④	J4 接続部
⑤	J5 接続部
⑥	J6 本管接続部

※本面図は公共マス流出方向を基準として作成しております。
※角度は上流側から見た下流点への変化量を示しています（合成角）。

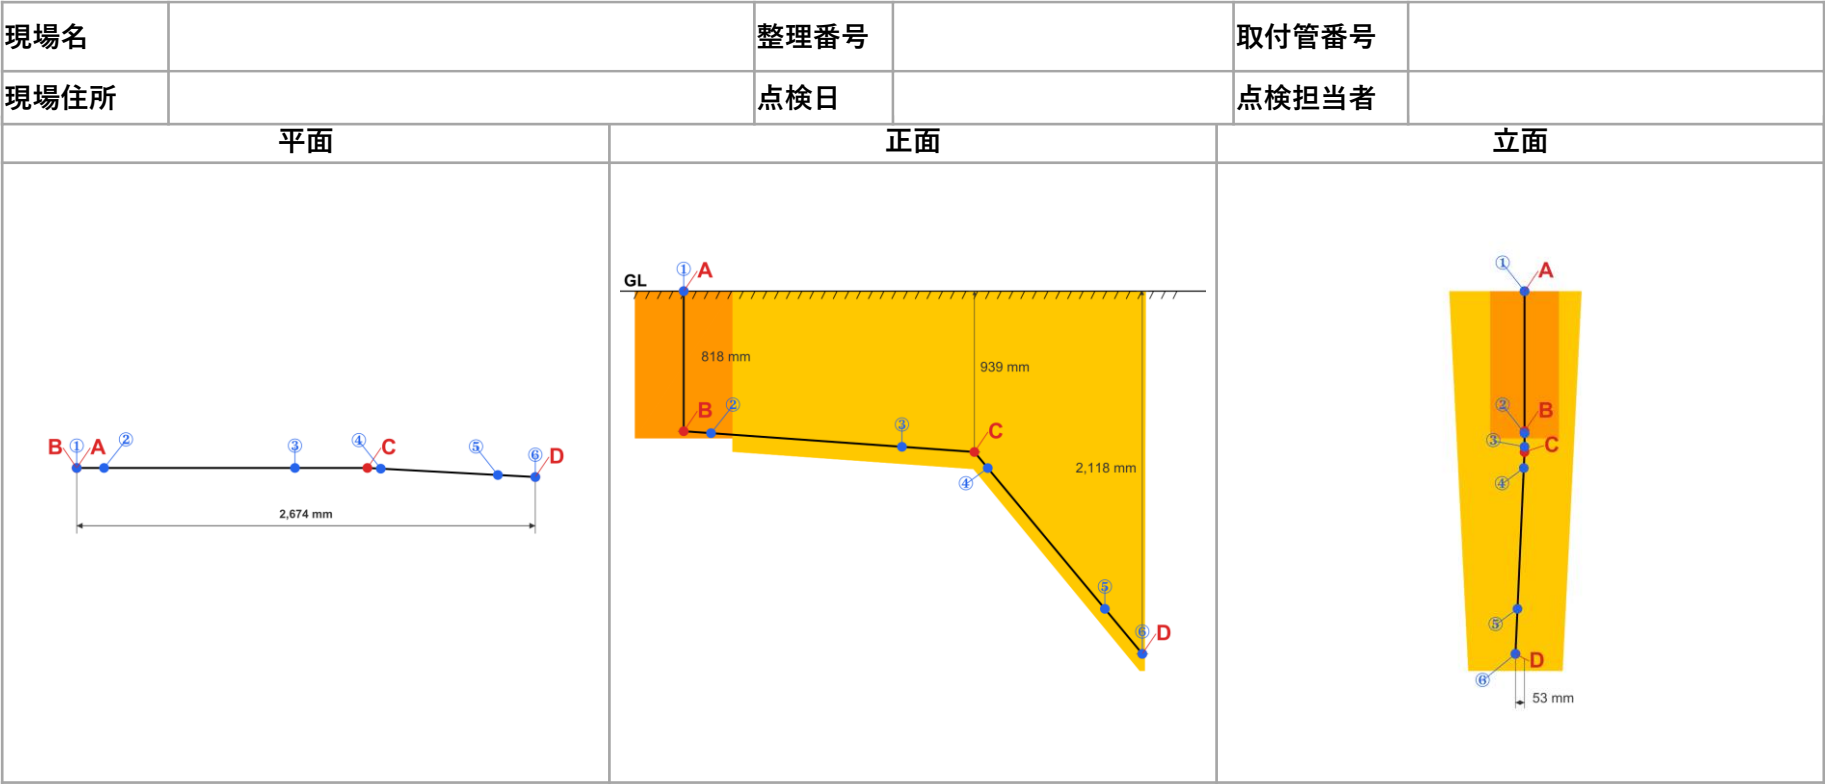

改築部材 ※改築部材は暫定版（現地確認後に修正）

種目	略号・サイズ	数量	改築部材No.
直管	立管 818mm	1	1
最終ます	MK 150P-200x0.6	1	2
取付管	SRB 150x4m	1	3
曲管	45SR-F 150	1	4
取付管	SRB 150x4m	1	5
支管	90SHR 200-150	1	6

土工量

種目	形状寸法	単位	数量
管路掘削		m ³	2.687
管路埋戻		m ³	2.462
発生土処理		m ³	0.225
ます掘削		m ³	0.170

特記事項
